

5.4 賸餘表土之處理方法、暫存地點及安全設施

本計畫預估賸餘土石方量約為20,227立方公尺，規劃將運送至同標段(非水土保持計畫範圍)之路堤區段進行填築；另對於部分不適宜做為路堤填築用途之材料，則外運至附近之合法土石方收容處理場所進行處理，本計畫區附近之合法土石方收容處理場所為展信實業有限公司(詳見圖5.4-1)，其核准之土石方處理量可滿足本計畫之棄土需求，若該土資場無法收容土方，可至另一合法土資場花建實業有限公司進行處理，詳見表5.4-1所示。

表 5.4-1 計畫鄰近地區土石方收容處理場

項次	場所名稱	地址	核准年處理量	營運期限	預估運距(公里)
1	展信實業有限公司	花蓮縣玉里鎮大禹里大禹 202-4 號	200,000	2018/01/23~2024/01/22	23
2	花建實業有限公司	花蓮縣鳳林鎮林榮里榮開路 39-1 號	361,350	2022/05/06~2025/05/05	60

資料來源：營建剩餘土石方資訊服務中心 <https://www.soilmovement.gov.tw/>

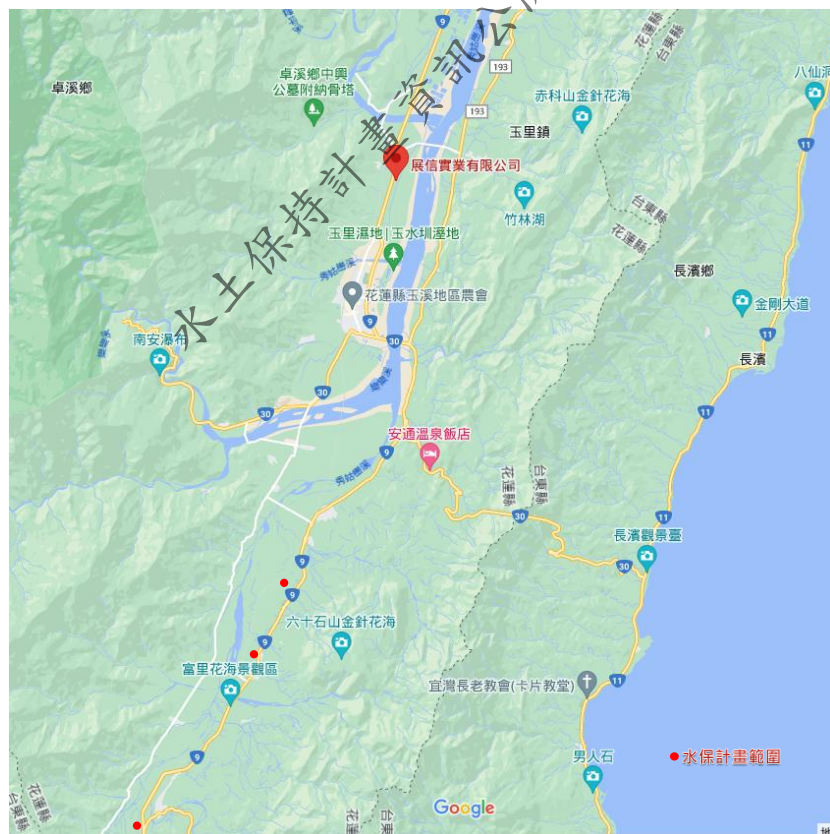


圖 5.4-1 計畫鄰近土石方堆置場與水土保持計畫範圍相對位置圖
