



直播法（撒草種植生）示意圖
N.T.S.

- 養護工作：
- 施工後應隨即澆水，並按時做好以下的養護工作，達到預期的覆蓋率。
- 1). 澆水：草苗種植後每天二至三次澆水，第二至三個月每五天澆水一次，三個月以後至養護期滿一年視實際需要適時澆水，澆水濕度需達土深10cm以上。
 - 2). 追肥：第一次追肥為種植完工後每一個月，以後每隔二至三個月追肥一次，使用複合肥料。
 - 3). 補植：如發現不萌芽、枯萎、或草苗滑濕處應隨時補植。
 - 4). 覆蓋率之檢討：草苗種植後，經澆水、追肥等養護後，須控制其覆蓋之存活率大於百分之八十。

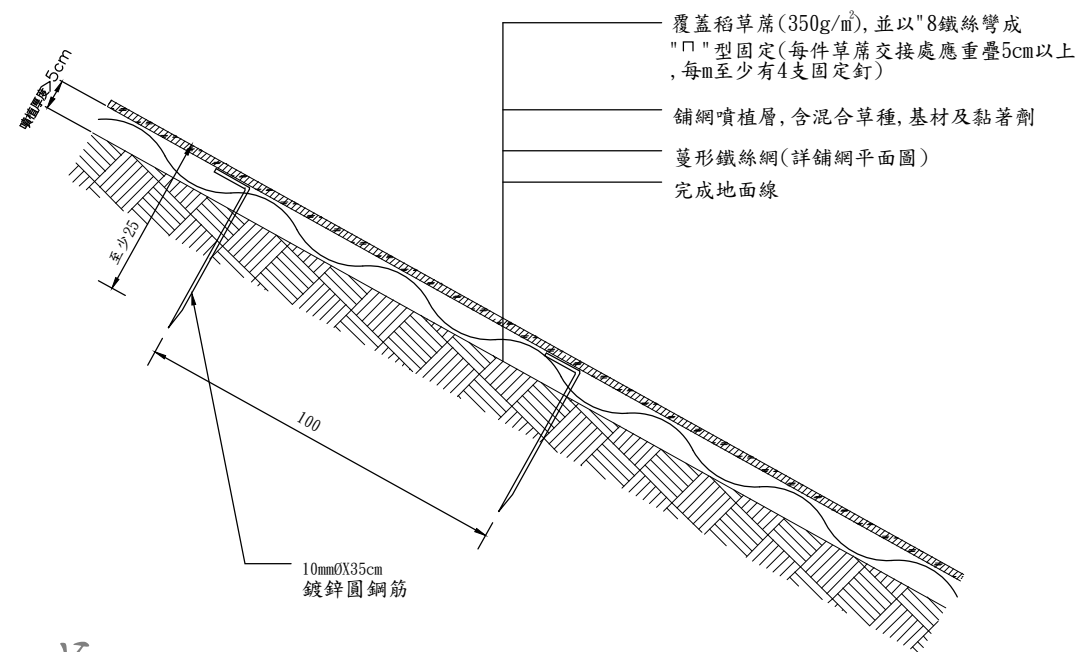

斷面
N.T.S.

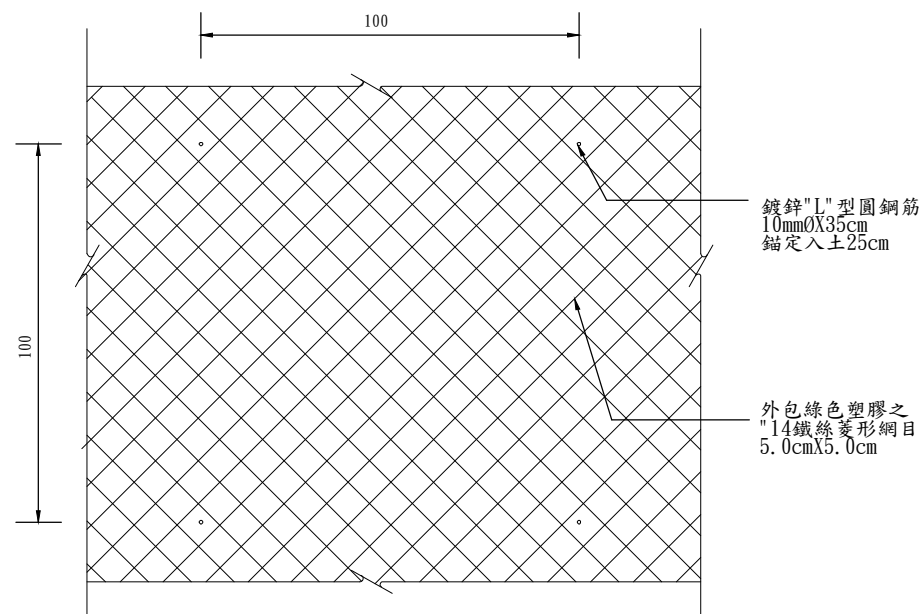

平面
N.T.S.

掛網噴植工法詳圖（挖方邊坡）
N.T.S.

水土保持義務人	
經濟部水利署 中區水資源分署	
承辦技師	
水土保持技師 鄧鳳儀	
計畫名稱	
大安大甲溪聯通管工程- 大甲溪輸水管第2標統包 工程第三區鯉魚潭第 二原水管(L0K+000~L0K+ 063)及后里圳延伸段 (H0K+271~H0K+316)工程 水土保持計畫	
比例尺 SCALE	
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
圖號及圖名	
圖6-6 植生方法設計圖	
校正 REVISED	
專業技師簽證	
頁碼	
—	
